SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA BIOMÉTRICO DEL PLANTEL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL SEDUCA

Integrantes: Juan Raul Laime Estrada

Omar Virgilio Lazo Ugarte

ANALISIS DE REQUERIMIENTOS

	REQUERIMIENTO	TIEMPO(HORAS)
1	REGISTRO DE USUARIO	5
2	AUTENTIFICACION	5
3	REGISTRO DE UNIDAD EDUCATIVA	6
4	ACTUALIZACION DE DATOS DE LA UNIDA DEDUCATIVA	15
5	REGISTRO BIOMETRICO DE PLANTEL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	30
6	REGISTRO DE HORARIOS	10
7	REGISTRO DE ASISTENCIA	8
8	SISTEMA DE IMAGENES	4
9	PERIMISOS	4
10	ACTUALIZACION DE PLANTEL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	10
11	REPORTES GENERALES	8
12	REPORTES DE UNIDAD EDUCATIVA	8
13	INPRIMIR REPORTE GENERAL	4
14	IMPRIMIR REPORTE UNIDAD EDUCATIVA	4


DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	TIEMPO	ESTADO	ENCARGADO	ANTECESOR
1	5	INICIADO	JUAN RAUL LAIME ESTRADA	
2	3	INICIADO	JUAN RAUL LAIME ESTRADA	1
3	6	INICIADO	OMAR VIRGILO LAZO UGARTE	
4	10	INICIADO	OMAR VIRGILO LAZO UGARTE	3
5	20	POR INICIAR	JUAN RAUL LAIME ESTRADA	1,2,3
6	10	POR INICIAR	OMAR VIRGILO LAZO UGARTE	1,2,3
7	6	POR INICIAR	OMAR VIRGILO LAZO UGARTE	1,2,3,5,6
8	4	POR INICIAR	JUAN RAUL LAIME ESTRADA	5
9	4	POR INICIAR	OMAR VIRGILO LAZO UGARTE	5,6
10	10	POR INICIAR	JUAN RAUL LAIME ESTRADA	5;6
11	8	POR INICIAR	OMAR VIRGILO LAZO UGARTE	3,6,7
12	8	POR INICIAR	JUAN RAUL LAIME ESTRADA	6,7
13	2	POR INICIAR	OMAR VIRGILO LAZO UGARTE	11
14	2	POR INICIAR	JUAN RAUL LAIME ESTRADA	12

El tiempo que tardara el proyecto es de 72 horas

Tomando en cuenta 2 horas por día tardaría 36 días en culminar el proyecto

RUTA CRÍTICA

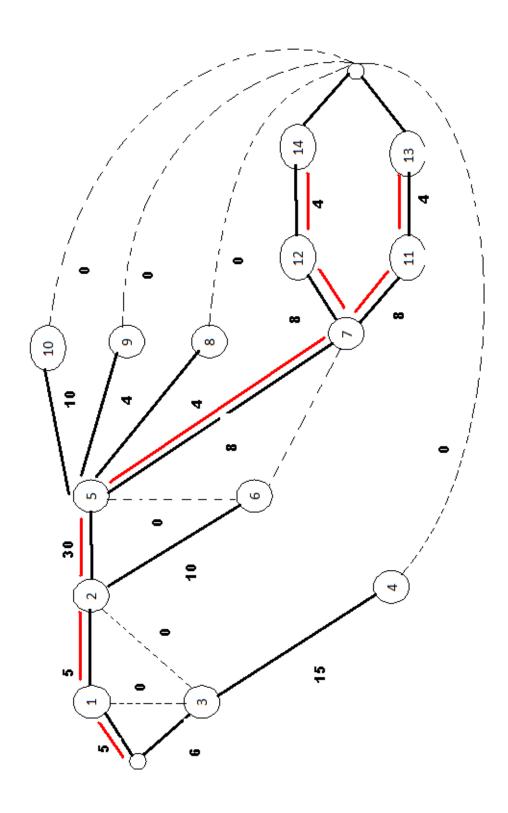

SPRINT N 1

ACTIVIDADES	TIEMPO	ESTADO	ENCARGADO	ANTECESOR
1	5	INICIADO	JUAN RAUL LAIME ESTRADA	
2	3	INICIADO	JUAN RAUL LAIME ESTRADA	1
3	6	INICIADO	OMAR VIRGILO LAZO UGARTE	
4	10	INICIADO	OMAR VIRGILO LAZO UGARTE	3
